

## Prosjektplan

### Bredbåndsutbygging 2019-2020

---

## Situasjon

Felles søknad fra Valdres til Nkom er innvilget. Oppland fylkeskommune har vedtatt å matche kommunene sitt bidrag inn i utbyggingsprosjektet, noe som betyr at samlet budsjett er om lag 20 millioner kroner.

Denne prosjektplanen beskriver hvordan arbeid og ressurser skal fordeles fremover slik at søknaden blir omsatt til ferdig utbygget bredbånd.

For dette prosjektet er Sør-Aurdal kommune prosjekteier på vegne av søkerkommunene.

## Oppdrag

Bygg bredbånd til husstander og bedrifter i Valdres ut i fra innvilget søknad.


## Utførelse

Arbeidet i prosjektet deles inn i 4 faser:

1. Endring av enkelte kartfigurer i forhold til opprinnelig søknad
2. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
3. Utvelgelse av tilbyder og kontraktskriving
4. Oppfølging av utbygging

Det settes opp en mediaplan for å følge prosjektet underveis som sørger for korrekt og tidsriktig informasjon utad.

Fasene fordeler seg hierarkisk etter følgende fremdriftsplan:

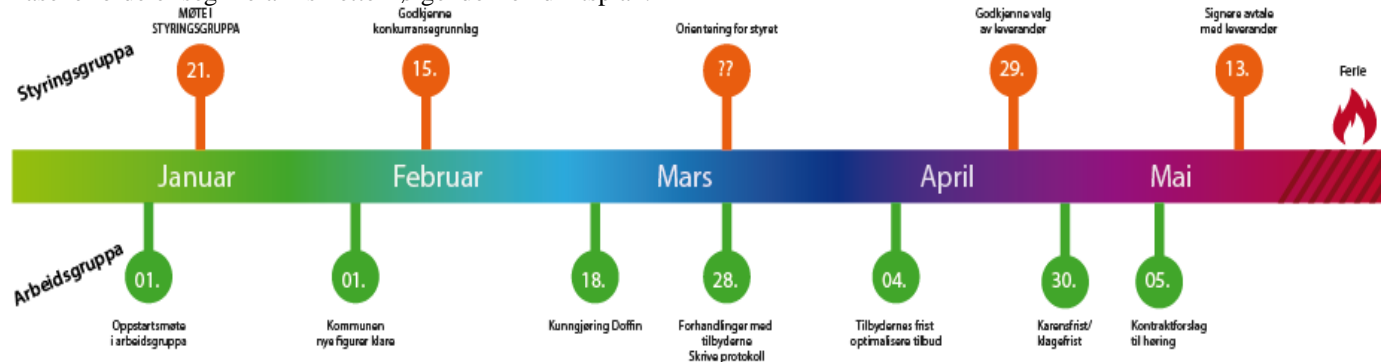

## Plan

Ambisjonen er at utbyggingen starter sensommeren 2019. For å lykkes med dette må det holdes fokus på at tidsplanen overholdes. Vi har hele tiden Oppland fylkeskommune tilgjengelig som en sparringspartner.

Enkelte av områdene som inngår i søknaden er blitt reservert av kommersielle aktører. Dette betyr at de berørte kommunene må finne erstatningsområder, Sør Aurdal kommune har utarbeidet en metodikk for dette som skal nyttes. Det nye grunnlaget må være oversendt arbeidsgruppen innen 1. februar slik at søknad om endring sendes til Nkom så snart som mulig.

Arbeidsgruppen utarbeider deretter et konkurransegrunnlag hvor det legges en forutsetning om endelig godkjenning hos Nkom. Konkurransegrunnlaget skal godkjennes av styringsgruppen 15. februar for så å legges ut på Doffin 18. mars.

I slutten av mars er forhandlingene med tilbyderne ferdig og protokollført. Vi forventer at disse ønsker å optimalisere sitt tilbud og har satt en frist til 4. april. for dette.

Styringsgruppen underrettes hele veien og velger leverandør 29. april.

Tilbyderne har en klagefrist i etterkant av dette, slik at vi kan regne med å skrive under kontrakt 5. mai.

Arbeidsgruppa vil så, i samarbeid med den enkelte kommune, følge opp utbyggingsarbeidet underveis og avlevere sluttrapport ved ferdigstillelse.

## Ansvarsfordeling

Prosjekteier:

Kommunene i Valdres v/Sør-Aurdal kommune

Styringsgruppe:

6 rådmenn og 6 ordførere

Arbeidsgruppe:

Leder arbeidsgruppe: Kjell Berge Melbybråten

Prosjektleder: Fredrik Holte Breien, VNK

Anskaffelse/juss: Ole Torgeir Dokkebakke, SAK

GIS/metode: Stig Solbrekken

Situasjonsbildet: Dag Arne Henriksen, OFK

Andre: Kontaktperson i hver enkelt kommune.

## Kvalitetssikring

Milepæler forankres godt i styringsgruppa og det er viktig å informere om endringer eller behov så tidlig som mulig.

Styringsgruppa kan kalle inn til møte eller be om avklaringer underveis ved behov.

Det utarbeides en egen medieplan i forbindelse med hvert prosjekt som sprer nødvendig informasjon utenfor de involverte i prosjektet.

Regionstyret informeres om fremgang i det aktuelle prosjekt etter ønske.

## Slutttilstand

Prosjektet er ferdig når utbyggingen er utført i henhold til kontrakt og et stort antall flere husstander og bedrifter i Valdres har fått tilgang til NGA-bredbånd.

## Økonomi

### Kostnader:

Styringsgruppemøter med for og etterarbeid.	Kr. 45.000
Arbeidsgruppemøter i hver kommune	Kr. 90.000
Forenkla kalkyler	Kr. 35.000
Forenkla kalkyler, hensyn til infr. Str.	Kr. 25.000
Arb. Med dokumentasjon til søknad	Kr. 45.000
Arbeid med anbud; utlysning og kontrakt	Kr. 55.000
Oppfølging av byggeprosess	Kr. 140.000
Samla kostnader i prosjektet	Kr. 400.000

### **Finansiering:**

Egne midler ved VNK og egeninnsats fra deltagere i prosjektet.	Kr. 200.000
Tilskudd fra Oppland fylkeskommune	Kr. 200.000
Samlet finansiering	<hr/> Kr. 400.000

## Relevante dokumenter

Handlingsprogram for VNK,  
Samarbeidsavtale mellom VNK og SAK  
Mandat til prosjektgruppa

## Varighet

Prosjektplanen er gjeldende fra den er underskrevet og inntil utbyggingen i henhold til konkurransegrunnlaget er ferdigstilt, tentativt høsten 2020.

Dato: -----

Underskrifter:

-----

For prosjekteier

Haakon Boie Ludvigsen

-----

For arbeidsgruppa

Kjell Berge Melbybråten
